
Library Search Module

План реалізації модуля пошуку та відображення книжок. Початок: 02.11.2026. Робочі дні: понеділок-п'ятниця.

Код	Завдання	Дні	Виконавці	Після
1.1	Функціональні вимоги	2	АН	
1.2	Нефункціональні вимоги	1	АН, РМ	1.1
М1	**Завершено формування вимог**	**0**		**1.2**
2.1	Прототип інтерфейсу	2	ДЗ	М1
2.2	Структура даних і data contract	2	АН, ВЕ	М1
М2	**Затверджено дизайн**	**0**		**2.1**
3.1	Головний екран пошуку	3	FE	М2, 2.2
3.2	Детальний перегляд книжки	2	FE	3.1
4.1	API пошуку книжок	3	ВЕ	М2, 2.2
4.2	API детальної інформації	2	ВЕ	4.1
4.3	Підключення бази даних	1	ВЕ	4.2
3.3	Інтеграція через REST API	2	FE, ВЕ	3.2, 4.3
М3	**Завершено розробку**	**0**		**3.3, 4.3**
5.1	Функціональне тестування пошуку	2	QA	М3
5.2	Тестування продуктивності	1	QA	5.1
5.3	Перевірка взаємодії клієнта і сервера	1	QA, FE	5.2
М4	**Пройдено тестування**	**0**		**5.3**
6.1	Усунення дефектів	2	FE, ВЕ	М4
6.2	Повторне тестування	1	QA	6.1
7.1	Деплой на сервер бібліотеки	1	ВЕ, РМ	6.2
7.2	Перевірка в робочому середовищі	1	QA	7.1
7.3	Передача рішення клієнту	0,5	РМ	7.2
М5	**Поставка продукту клієнту**	**0**		**7.3**

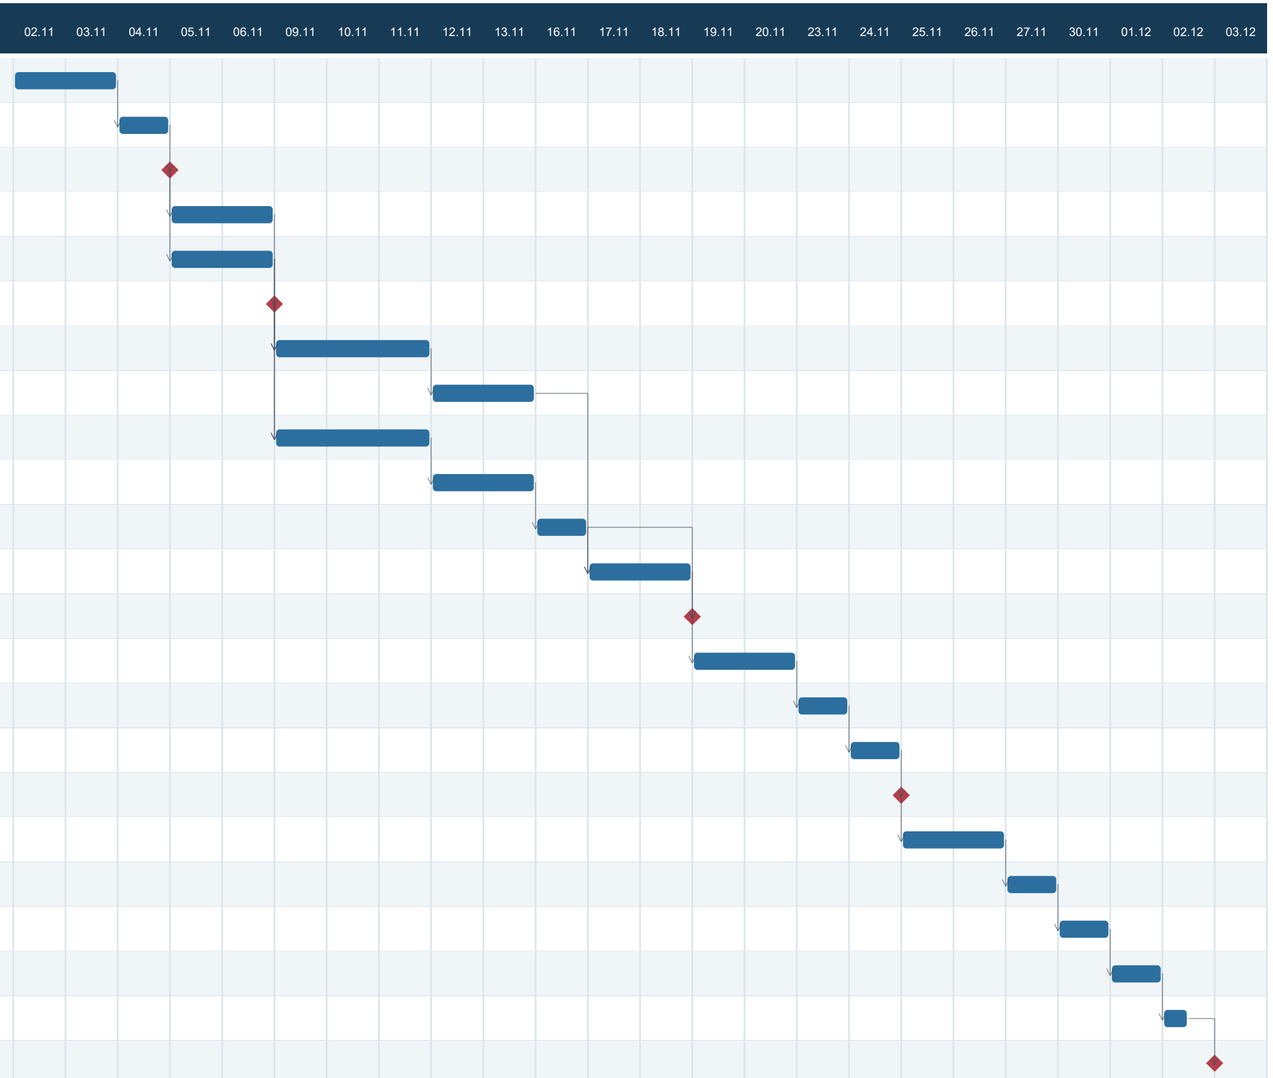

АН — аналітик; ДЗ — дизайнер; FE — фронтенд-розробник; ВЕ — бекенд-розробник; QA — тестувальник; РМ — менеджер проєкту.

Сині смуги — задачі; червоні ромби — контрольні точки; стрілки — залежності «завершення → початок».

7.3: 0,5 дня = 4 години. У файлі GanttProject зарезервовано один день із завантаженням РМ 50% (мінімальний календарний крок програми).
